

1 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTEES
 2 TELEFAX 2534-3-10

3 SESION ORDINARIA

4 ACTA # 04

5 Acta número cero cuatro de la Sesión Ordinaria que celebra el Concejo Municipal
 6 de Distrito de Cervantes, el día veintinueve de enero del dos mil diecinueve, al
 7 ser las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos, con la asistencia de los
 8 concejales:

9 MIEMBROS PRESENTES

10 Jorge Adolfo Aguilar Mora	Quien Preside
11 Anderson Calderón Brenes	Propietario
12 María Cecilia Valverde Vargas	Propietaria.

13 FUNCIONARIOS

14 Marvin Gustavo Castillo Morales	Intendente
15 Thais Araya Aguilar	Secretaria

16 MIEMBROS AUSENTES

17 Jeannette Moya Granados
 18 Jeannette Umaña Chinchilla
 19 Preside Jorge Adolfo Aguilar ora en ausencia de la señora Presidenta Municipal,
 20 como se establece en el artículo 33 del Código Municipal.

21 Se comprueba el quorún dándose inicio a la sesión con la presentación de la
 22 siguiente agenda;

23 ARTICULO I: ORACION

24 ARTICULO II: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

25 ARTICULO III: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

26 ARTICULO IV: INFORME DE INTENDENCIA

27 Presentación del Informe de Evaluación Semestral 2018.

28 ARTICULO V: CIERRE DE SESIÓN.

29 Aprobada en forma unánime y en firme.

30 ARTICULO II:

31 LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR

32 Se procede a dar lectura al acta anterior puesta en discusión y analizada.

33 Se hacen las siguientes observaciones:

34 Inciso a): Consulta Jorge Adolfo Aguilar Mora, si ya se inició la asfaltada en
 35 caminos:

36 Les informa el señor Intendente todavía no porque la empresa adjudicada CBZ
 37 tuvo un problema con el quebrador de la cantera y esto atrasa la producción del
 38 asfalto por los agregados, esperemos no sea por muchos días para poder iniciar
 39 lo antes posible. Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar ojala para aprovechar el
 40 verano.

41 Por no tener ninguna objeción más al acta, se aprueba en forma unánime y firme.

42

43

44

45

ARTICULO III:

LECTURA DE CORRESPONDENCIA.

46
47
48
49
50
51
52

Se procede a dar lectura a la siguiente correspondencia:

1-Comité de Vecinos Urbanización Las Aguas, Cartago, Cervantes 2019. Señores Consejo Municipal de Cervantes. La presente es para saludarles y a la vez solicitar una sección (bis) para lograr formar el Comité de Vecinos Urbanización Las Aguas, el cuál estaría conformado por las siguientes personas:

NOMBRE	CEDULA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
Jonny Torres Gutiérrez	108500715	ventas@fumigadoracorin.com	83154804
Daniela Solano Cordero	115240594	danisolco@gmail.com	84935238
Ronny Fuentes Luna	303920437	ronnymoon@gmail.com	87943059
Damaris Villegas Flores	1558180411	Angelvillegas95@gmail.com	83526525
Eva Gamboa Badilla	701610874		87835203

53

Una vez revisado la conformación y comprobado la equidad de género, se acuerda nombrar el Comité Vecinos Urbanización Las Aguas, convocar para el martes 5 de febrero 2019 a las 5:30p.m para su juramentación.

54
55
56
57

2- ASOPAMCE: Cervantes 21 de enero del 2019. Consejo Municipal Distrito de Cervantes. La Asociación Pro Adulto Mayor Nueva Esperanza le informa la conformación de la Junta Administrativa Adulto Mayor.

58
59
60

Según artículo décimo segundo del acta de constitución Pro Adulto Mayor Ampara en el inciso A del artículo décimo quinto del Acta Constitutiva y rige por el período de 30 de noviembre del 2018 al 30 de noviembre 2020 y dice así.

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

1. José Masis Quirós Presidente
2. Olga Gómez Moya Vicepresidenta
3. María José Casasola Gómez Secretaria
4. Alvaro Chinchilla Solano Fiscal
5. Estrella Brenes Garita Tesorera
6. Alicia Molina Casasola Vocal 1
7. José Manuel Castillo Quirós Vocal 2
8. Guillermo Francisco Valverde Bonilla Vocal 3.

71
72

Firma en documento: José Masis Quirós Presidente. Olga Gómez Vicepresidenta y Alvaro Chinchilla Solano Fiscal.

73
74
75
76

Se hace la observación que se debe de hacer consulta legal si en esta conformación de Junta Administrativa Adulto Mayor, puede ser integrada por parientes en línea directa, como lo es el caso de la Sra Vicepresidenta y Secretaria.

77
78
79
80
81

3-José Masis Q. Presidente del CDRC. Señores: Miembros del consejo Municipal de Cervantes: Por este medio el CDRC le informa al Concejo Municipal la renuncia de la Señora Ana Salazar, fiscal del CDRC, se les solicita tomar en cuenta el posible nombramiento de otra persona ya que es suma importancia. Sin más por el momento, se despide: José Masis Q. Presidente.

82
83
84
85
86

4-Sr. Joaquín Ríos Solano Ced 3-440-515: Cartago 28 de Enero del 2019. Consejo Municipal Distrito de Cervantes. Estimados (as) Señores(as): Reciban un cordial saludo, la presente es para informarles el interés de mi persona Joaquín Ríos Solano, Cédula 304400515, vecino de Cervantes de Alvarado; en formar parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Tengo a cargo un

87 equipo de futsala hace 1 año, con el mismo hemos participado en varios torneos;
 88 trabajo para la Caja Costarricense del Seguro Social (10años), en el
 89 Departamento de Enfermería como Oficinista, a su vez estoy cursando la carrera
 90 de Contaduría Pública en la Universidad Florencia del Castillo.

91 Sin otro particular y esperando una respuesta, se despide . Atentamente; Joaquín
 92 Ríos Solano Ced. 3440-515, Tel. 6033-3407, correos; jrs.2510@hotmail.com
 93 jariosso@ccss.sa.cr.

94 Una vez conocida la información suministrada por el señor presidente del Comité
 95 de Deportes de Cervantes, sobre la renuncia de la señora Ana Salazar fiscal, y a
 96 nota que remite el Sr. Joaquín Ríos Solano, se comenta que para efectuar el
 97 nombramiento se debe de presentar una terna de las organizaciones deportivas,
 98 para efectuar el respectivo nombramiento, ya que la señora Salazar era
 99 representante del nombramiento de las organizaciones deportivas.

100 5- Permisos de Construcción.

101 1- Elida Estrada Méndez; solicita permiso para ampliación segunda planta
 102 por 76mts, ubicada en el Bajo esquina Noreste de la Plaza del Bajo.

103 Una vez conocido el permiso de construcción se acuerda trasladar a la intendencia
 104 para que conjuntamente con la ingeniera Betsy Quesada se continúe con el
 105 trámite.

106 ARTICULO IV

107 1-PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL II
 108 SEMESTRES 2018.

109 Marvin Gustavo Castillo Morales, Intendente Municipal, presenta ante el Concejo
 110 Municipal de Distrito de Cervantes; el Informe de Evaluación Semestral del II
 111 Semestre 2018, Conocida y analizada la información al respecto. En forma
 112 unánime; con los votos afirmativos de los concejales propietaria(os); Jorge Adolfo
 113 Aguilar Mora, , Anderson Calderón Brenes, María Cecilia Valverde Vargas se da
 114 el visto bueno, aprobación al Informe de Evaluación Semestral correspondiente al
 115 II Semestre 2018, presentado por parte de la Intendencia Municipal, envíese el
 116 presente acuerdo ante la Municipalidad de Alvarado, para su conocimiento y su
 117 debida tramitación ante el ente contralor. ACUERDO FIRME. Con copia a Lizeth
 118 Acuña. Encargada de Presupuesto, Municipalidad de Alvarado. Documentos
 119 adjuntos, en forma digital.

120

121 Cervantes, 22 de enero del 2019.

122

123 **ASUNTO: INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL. II SEMESTRE 2018**

124 Se presentan los resultados de ejecución de los recursos y cumplimiento de metas, al
 125 segundo semestre del año 2018, por parte del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes:

126 **3. Resultados, logros y desviaciones**


127 **Programa I. Administración General**

128 **Concejo Municipal Distrito de Cervantes**

129 **3.1. Programa I. Administración General**

130 En el programa I del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, se incluyen las
131 áreas de Intendencia, Vice intendencia, Secretaría Municipal, Contabilidad y Tesorería.

132 **Misión:** Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión
133 municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera
134 más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con
135 sus cometidos.

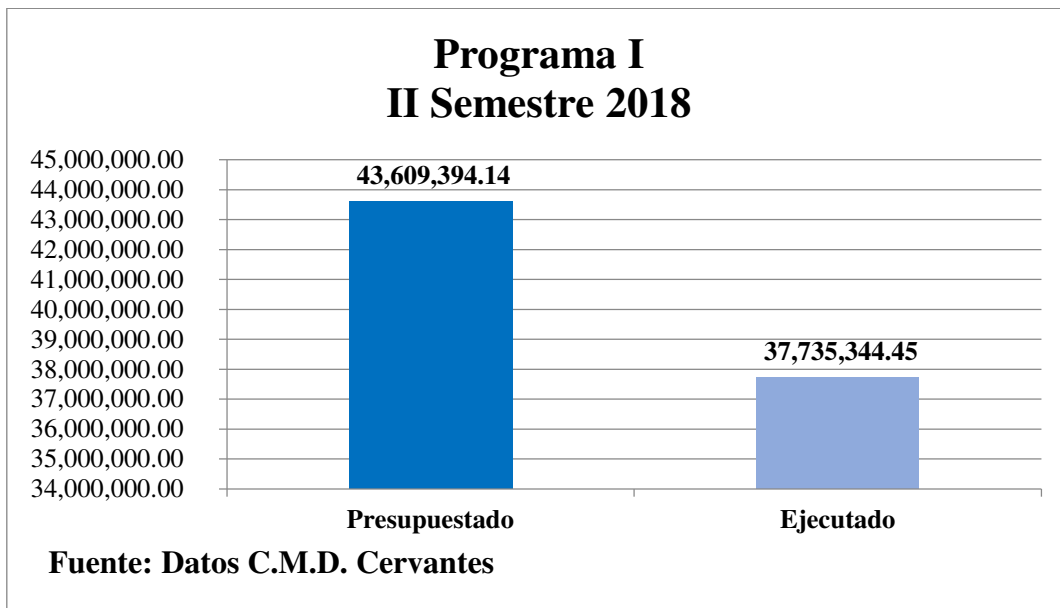

136

137

138

139 **3.1.1. Meta 1. (Actividad 01-Administración General)**

140 **3.1.1.1. Principales logros**

141 • Debido a las mejoras realizadas con la implementación del sistema
142 informático de ingresos municipales y los esfuerzos en la gestión de cobro, se
143 obtuvieron resultados significativos en la recaudación del año 2018; con los cuales, se
144 logran cubrir los egresos necesarios para realizar la gestión administrativa del Concejo
145 Municipal de Distrito de Cervantes. En el transcurso del segundo semestre del año se

146 lograron entregar aproximadamente 150 notificaciones de cobro, cuyos resultados se
147 reflejan en los ingresos recaudados; principalmente de los servicios básicos que brinda
148 la Institución.

149 **3.1.1.2. Principales desviaciones**

150 • Se ejecutaron las partidas presupuestarias conforme a las necesidades de
151 Institución para realizar la gestión administrativa, los saldos disponibles al cierre del
152 año 2018 fueron mínimos.

153 **3.1.1.3. Acciones propuestas**

154 • Continuar con la gestión de cobro y buscar formas de agilizar trámites de
155 manera tal que permita recaudar los ingresos requeridos para seguir cubriendo los
156 egresos relacionados con la Administración General del Concejo Municipal de Distrito
157 de Cervantes.

158

159 **3.1.2. Meta 2. (Actividad 04-Registro de Deudas, Fondos y Transferencias)**

160 **3.1.2.1. Principales logros**

161 • En cuanto a las transferencias corrientes a las distintas entidades
162 presupuestadas, a la fecha de corte (31 de diciembre del 2018) se realizaron pagos
163 totales según montos presupuestados a las siguientes instituciones:

- 164 ✓ Ministerio de Hacienda ONT 1% IBI
- 165 ✓ Junta Administrativa Registro Nacional (3% IBI)
- 166 ✓ Aporte CONAGEBIO (10% Ley 7788)
- 167 ✓ Fondo Parques Nacionales (70% del 90% de la Ley 7788)
- 168 ✓ Juntas de Educación 10% IBI
- 169 ✓ Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 0.5%
- 170 ✓ Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago
- 171 ✓ Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica
- 172 ✓ Unión Nacional de Gobiernos Locales

173 Así como transferencias parciales de lo correspondiente al Comité Distrital de Deportes.

174 **3.1.2.2. Principales desviaciones**

175 • Al cierre del periodo 2018, únicamente no se logró girar la totalidad de la
176 transferencia correspondiente al Comité Distrital de Deportes.

177 **3.1.2.3. Acciones propuestas**

178 • Establecer lineamientos para el correcto funcionamiento del Comité Distrital
179 de Deportes, que permitan la ejecución de los recursos correspondientes de forma
180 eficiente, en beneficio de las necesidades de la comunidad.

181 **4. Resultados, logros y desviaciones**

182 **Programa II. Servicios Comunes**


183 **Concejo Municipal Distrito de Cervantes**

184 **4.1. Programa II. Servicios Comunes**

185 En el Programa II Servicios Comunitarios se consideran los tres servicios básicos:
186 02-recolección de basura, 03-mantenimiento de calles y caminos, y 06-acueducto, por parte
187 del C.M.D. Cervantes. Además, los servicios 09-educativos, culturales, y deportivos, 25-
188 protección del medio ambiente, y 28-atención de emergencias.

189 **Misión:** Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

190 **Análisis de los resultados físicos financieros**

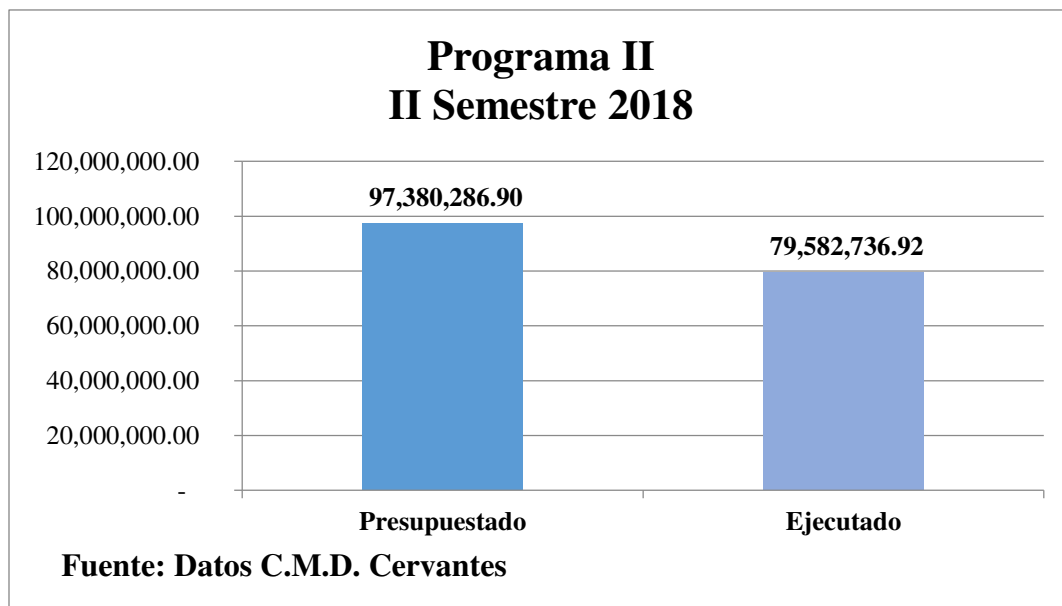

191

192 En relación al programa II durante el segundo semestre del periodo 2018 se ejecutó
193 un 81.72% del presupuesto aprobado para dicho semestre, y con referencia al presupuesto
194 según asignación presupuestaria para el segundo semestre 2018 de ¢97.380.286,90; se
195 ejecutó un monto de ¢79.582.736,92.

196 **4.1.1. Meta 1. (Servicio 02 - Recolección de Basura)**

197 **4.1.1.1. Principales logros**

198 • Con los recursos asignados a esta meta se han sufragado los gastos
199 necesarios para brindar el servicio de recolección diferenciado de residuos sólidos a la
200 comunidad y la disposición final de residuos, durante el segundo semestre del 2018.

201 **4.1.1.2. Principales desviaciones**

202 • Al corte del segundo semestre del 2018, no se lograron ejecutar partidas
203 consideradas en el presupuesto extraordinario 02-2018; dentro de las que destaca, las
204 reparaciones al
205 camión recolector con el fin de contar con otro medio para mejorar el servicio ofrecido de
206 recolección de residuos.

207 **4.1.1.3. Acciones propuestas**

208 • Para el periodo 2019 planificar y presupuestar los recursos del servicio de
209 recolección de basura conforme las necesidades existentes, considerando tomar medidas
210 para mejorar la recaudación de este rubro.

211

212 **4.1.2. Meta 2. (Servicio 03 - Mantenimiento de Caminos y Calles)**

213 **4.1.2.1. Principales logros**

214 • La ejecución de los recursos referentes a esta meta, corresponden a los
215 egresos incurridos y necesarios para mantenimiento de calles y caminos vecinales.

216 **4.1.2.2. Principales desviaciones**

217 • Al corte del segundo semestre del 2018, no fue posible ejecutar diversas
218 partidas presupuestarias programadas, por dificultades de tiempo y recurso humano.

219 **4.1.2.3. Acciones propuestas**

- 220 • Mejorar la ejecución y planificación de las partidas presupuestarias para el
221 próximo periodo.

222 **4.1.3. Meta 3. (Servicio 06 - Acueducto)**

223 **4.1.3.1. Principales logros**

- 224 • Los recursos ejecutados en esta meta corresponden a los egresos necesarios para
225 realizar las labores de mantenimiento rutinario de las tuberías, y atención de averías.
226 Destacan, además; los análisis microbiológicos y físico-químicos de agua potable, la
227 contratación de proyecto de catastro de red y de usuarios del acueducto municipal, y la
228 compra de terreno No. finca: 260677-donde se localiza tanque almacenamiento de agua
229 potable acueducto municipal- con el propósito de iniciar a regularizar la situación de
230 estas propiedades.

231 **4.1.3.2. Principales desviaciones**

- 232 • Al corte del segundo semestre del 2018, debido a dificultades
233 administrativas, de tiempo y de recurso humano, no fue posible ejecutar la totalidad de
234 las partidas presupuestarias contempladas.

235 **4.1.3.3. Acciones propuestas**

236 Mejorar la ejecución y planificación de las partidas presupuestarias para el próximo periodo

237 **4.1.4. Meta 4. (Servicio 09 – Educativos, Culturales y Deportivos)**

238 **4.1.4.1. Principales logros**

- 239 • Se ejecutaron las partidas de egresos requeridas para el desarrollo de
240 actividades dirigidas a fomentar el esparcimiento social-familiar, y cultural en la
241 comunidad de Cervantes; tales como, la Semana Cívica, Festival de la Luz,
242 presentación Orquesta Sinfónica Nacional, y otros relacionados.



243

244 **4.1.4.2. Principales desviaciones**

- 245 • Debido a factores externos (como lo fue la huelga nacional que afectó
246 principalmente el funcionamiento de las instituciones educativas), no se ejecutó la
247 totalidad de las actividades planeadas para las celebraciones del mes patrio.

248 **4.1.4.3. Acciones propuestas**

- 249 • Continuar en el próximo periodo planificando y llevando a cabo de forma
250 organizada entre las fuerzas vivas del distrito; actividades dentro de este ámbito, para el
251 disfrute de la comunidad cervanteña.

252

253 **4.1.5. Meta 5. (Servicio 25 – Protección del Medio Ambiente)**

254 **4.1.5.1. Principales logros**

- 255 • Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta.

256 **4.1.5.2. Principales desviaciones**

- 257 • Por dificultades administrativas, de plazos y falta de recurso humano, no se
258 logran ejecutar la totalidad de las metas.

259 **4.1.5.3. Acciones propuestas**

- 260 • Dar seguimiento a la ejecución de estos recursos en el próximo periodo, que
261 serán incorporados en presupuesto extraordinario en el año 2019.

262

263 **4.1.6. Meta 6. (Servicio 28 – Atención emergencias)**

264 **4.1.6.1. Principales logros**

- 265 • Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta.

266 **4.1.6.2. Principales desviaciones**

- 267 • Por dificultades administrativas, de plazos y falta de recurso humano, no se
268 logran ejecutar la totalidad de las metas.

269 **4.1.6.3. Acciones propuestas**

- 270 • Dar seguimiento a la ejecución de estos recursos en el próximo periodo, que
271 serán incorporados en presupuesto extraordinario en el año 2019.

272 **5. Resultados, logros y desviaciones**

273 **Programa III. Inversiones**


274 **Concejo Municipal Distrito de Cervantes**

275 **5.1. Programa III. Inversiones**

276 En el programa III Inversiones se incorporan los proyectos de inversión según el
277 presupuesto ordinario del año 2018, los correspondientes a los recursos de la Ley N°8114-
278 9329, y los presupuestos extraordinarios 1-2018 y 2-2018.

279 **Misión:** Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de
280 satisfacer sus necesidades.

281 **Análisis de los Resultados Físico Financieros**

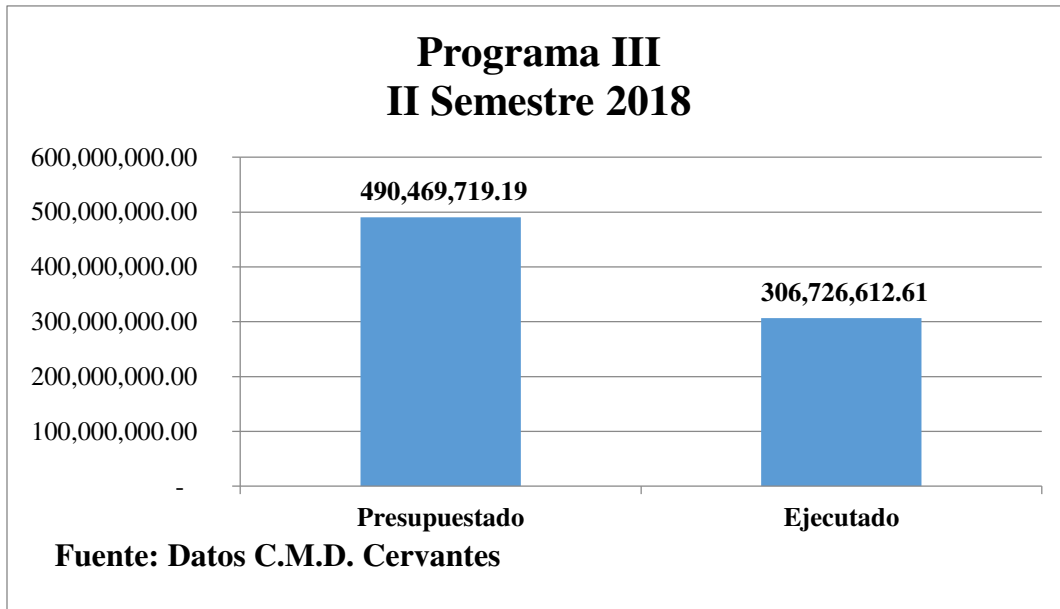

282

283 En el Programa III, se ejecutó el 62.54% de los recursos aprobados para los
 284 proyectos de inversión durante el segundo semestre del 2018; con referencia al presupuesto
 285 con asignación presupuestaria para dicho semestre que asciende al monto de
 286 ¢490.469.719,19; ejecutándose la suma de ¢306.726.612,61.

287 **5.1.1. Meta - proyecto: Obra de Conducción de Agua Potable**

288 **5.1.1.1. Principales logros**

- 289 • Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta.

290 **5.1.1.2. Principales desviaciones**

- 291 • Por dificultades de plazos y falta de recurso humano, no se ejecutaron la
 292 totalidad de los proyectos relacionados con el servicio de acueducto del periodo 2018.

293 **5.1.1.3. Acciones propuestas**

- 294 • Conforme se va consolidando el área de acueducto, se ordenarán y priorizan
 295 los proyectos a ejecutar de forma eficiente; bajo criterios técnicos y de profesionales en
 296 el área, para los siguientes periodos.

297 **5.1.2. Meta - proyecto: Instalación de Hidromedidores**

298 **5.1.2.1. Principales logros**

299 • Durante el segundo semestre del 2018 se inicia el proceso de instalación de
 300 hidromedidores en el distrito de Cervantes, logrando la instalación de aprox.600
 301 hidrómetros en 4 meses de dicho semestre. Para lo cual; se ejecutaron recursos en la
 302 contratación de personal bajo la modalidad de jornales, adquisición de materiales de
 303 PVC (tuberías y accesorios requeridos para su instalación), así como piedra, cemento;
 304 entre otros.
 305



306
 307

308 **5.1.2.2. Principales desviaciones**

309 • Al corte del segundo semestre del 2018; no se logró ejecutar el proyecto en
 310 su totalidad.

311 **5.1.2.3. Acciones propuestas**

312 • Planificar la ejecución de los recursos para lograr desarrollar los proyectos
 313 en su totalidad y atendiendo las necesidades y mejoras requeridas para el servicio de
 314 acueducto.

315 **5.1.3. Meta - proyecto: Unidad Técnica**

316 **5.1.3.1. Principales logros**

317 • Se ejecutaron los recursos en el pago de remuneraciones a ingeniera de
 318 Gestión Vial y demás cargas patronales, y otros gastos relacionados con la gestión
 319 administrativa de esta área.

320 **5.1.3.2. Principales desviaciones**

321 • Algunas partidas presupuestarias no fueron necesarias ejecutar al corte del
 322 segundo semestre 2018, según las necesidades que surgieron.

323 **5.1.3.3. Acciones propuestas**

- 324 • Continuar con la ejecución de los proyectos programados para el siguiente
325 periodo, y según las obligaciones/tareas de la Unidad Técnica Gestión Vial para
326 asegurar el uso eficiente de los recursos de la Ley N°8114-9329.

327

328 **5.1.4. Meta - proyecto: Recarpeteo de Camino San Pancracio. Cód. 3-06-055**

329 **5.1.4.1. Principales logros**

- 330 • Según oficio CMDC-IGV-064-2018 al corte del segundo semestre 2018,
331 queda adjudicado el proyecto para el suministro y colocación de mezcla asfáltica en 5
332 cm de espesor a un ancho promedio de 5 metros como continuidad de asfaltado del
333 camino San Pancracio en 400 ML iniciando desde el entronque de la Ruta 10, ya que se
334 encuentra en mal estado.

335 **5.1.4.2. Principales desviaciones**

- 336 • El proyecto queda como compromiso presupuestario del año 2018, no fue
337 posible ejecutarlo en el mismo año debido contraposiciones entre la planificación de los
338 proyectos y los desembolsos de los recursos.

339 **5.1.4.3. Acciones propuestas**

- 340 • Ajustar la planificación de los proyectos para los siguientes periodos según
341 el comportamiento de los desembolsos de los recursos de la Ley N°8114-9329, para que
342 mientras sea viable se puedan evitar los compromisos presupuestarios.

343 **5.1.5. Meta - proyecto: Construcción de aceras en Camino San Pancracio.**
344 **Cód.- 3-06-055**

345 **5.1.5.1. Principales logros**

- 346 • Según oficio CMDC-IGV-056-2018 al corte del segundo semestre 2018, se
347 adjudica el proyecto de construcción de acera en sector camino San Pancracio por 530
348 ML en 10 cm de espesor y 1,20 metros de ancho, a fin de dar espacio a las personas que
349 transitan por el lugar.

350 **5.1.5.2. Principales desviaciones**

351 • El proyecto queda como compromiso presupuestario del año 2018, no fue
352 posible ejecutarlo en el mismo año debido contraposiciones entre la planificación de los
353 proyectos y los desembolsos de los recursos.

354 **5.1.5.3. Acciones propuestas**

355 • Ajustar la planificación de los proyectos para los siguientes periodos según
356 el comportamiento de los desembolsos de los recursos de la Ley N°8114-9329, para que
357 mientras sea viable se puedan evitar los compromisos presupuestarios.

358

359 **5.1.6. Meta - proyecto: Asfaltado Camino Mata Guineo. Cód. 3-06-003**

360 **5.1.6.1. Principales logros**

361 • Según oficio CMDC-IGV-051-2018 al corte del segundo semestre 2018,
362 queda adjudicado el proyecto para el suministro y colocación de mezcla asfáltica en 5
363 cm de espesor como continuidad al asfaltado en camino Mata Guineo en tramos críticos
364 por 600 ML.

365 **5.1.6.2. Principales desviaciones**

366 • El proyecto queda como compromiso presupuestario del año 2018, no fue
367 posible ejecutarlo en el mismo año debido contraposiciones entre la planificación de los
368 proyectos y los desembolsos de los recursos.

369 **5.1.6.3. Acciones propuestas**

370 Ajustar la planificación de los proyectos para los siguientes periodos según el
371 comportamiento

372 • de los desembolsos de los recursos de la Ley N°8114-9329, para que
373 mientras sea viable se puedan evitar los compromisos presupuestarios.

374 **5.1.7. Meta - proyecto: Alcantarillado y drenajes Camino San Ignacio. Cód. 3-**
375 **06-010**

376 **5.1.7.1. Principales logros**

- 377 • Durante el segundo semestre del 2018 se ejecuta este proyecto, de
378 construcción de cordón de caño, cajas pluviales y obras adicionales para la canalización
379 de aguas pluviales en Camino San Ignacio.



380

381 **5.1.7.2. Principales desviaciones**

- 382 • El proyecto fue ejecutado conforme lo programado en el segundo semestre
383 2018.

384 **5.1.7.3. Acciones propuestas**

- 385 • Continuar en los siguientes periodos con el desarrollo de este tipo de
386 proyectos conforme las necesidades de la población.

387

388 **5.1.8. Meta - proyecto: Asfaltado Camino San Martín - Las Trojas**

389 **5.1.8.1. Principales logros**

- 390 • Según oficio CMDC-IGV-065-2018 al corte del segundo semestre 2018,
391 queda adjudicado el proyecto de suministro y colocación de mezcla asfáltica en 5 cm de
392 espesor a un ancho promedio de 4 metros como mejora al camino que conecta el sector
393 de San Martín con Mata Guineo, tramo que se encuentra en mal estado.

394 **5.1.8.2. Principales desviaciones**

- 395 • El proyecto queda como compromiso presupuestario del año 2018, no fue
396 posible ejecutarlo en el mismo año debido contraposiciones entre la planificación de los
397 proyectos y los desembolsos de los recursos.

398 **5.1.8.3. Acciones propuestas**

- 399 • Ajustar la planificación de los proyectos para los siguientes periodos según
400 el comportamiento de los desembolsos de los recursos de la Ley N°8114-9329, para que
401 mientras sea viable se puedan evitar los compromisos presupuestarios.

402

403 **5.1.9. Meta - proyecto: Asfaltado Camino Divino Niño - Las Cumbres**

404 **5.1.9.1. Principales logros**

- 405 • Según oficio CMDC-IGV-051-2018 al corte del segundo semestre 2018,
406 queda adjudicado el proyecto de suministro y colocación de mezcla asfáltica en 5 cm de
407 espesor en camino que comunica sector Las Cumbres con barrio Divino Niño por 580
408 ML.

409 **5.1.9.2. Principales desviaciones**

- 410 • El proyecto queda como compromiso presupuestario del año 2018, no fue
411 posible ejecutarlo en el mismo año debido contraposiciones entre la planificación de los
412 proyectos y los desembolsos de los recursos.

413 **5.1.9.3. Acciones propuestas**

- 414 • Ajustar la planificación de los proyectos para los siguientes periodos según
415 el comportamiento de los desembolsos de los recursos de la Ley N°8114-9329, para que
416 mientras sea viable se puedan evitar los compromisos presupuestarios.

417

418 **5.1.10. Meta - proyecto: Alcantarillado y obras de arte Camino Divino Niño -**
419 **Las Cumbres Cód. 3-06-029**

420 **5.1.10.1. Principales logros**

- 421 • Durante el segundo semestre del 2018 se ejecuta este proyecto, de
422 construcción de cuneta, cajas pluviales y obras adicionales para la canalización de
423 aguas pluviales en sector Divino Niño, que en temporal de invierno la comunidad se ve
424 afectada a falta de un alcantarillado pluvial.



425

426 **5.1.10.2. Principales desviaciones**

- 427 • El proyecto fue ejecutado conforme lo programado en el segundo semestre
428 2018.

429 **5.1.10.3. Acciones propuestas**

- 430 • Continuar en los siguientes periodos con el desarrollo de este tipo de
431 proyectos conforme las necesidades de la población.

432

433 **5.1.11. Meta - proyecto: Recarpeteo Camino Las Aguas**

434 **5.1.11.1. Principales logros**

- 435 • Según oficio CMDC-IGV-051-2018 al corte del segundo semestre 2018,
436 queda adjudicado el proyecto de suministro y colocación de mezcla asfáltica en 5 cm de
437 espesor en camino Las Aguas en 750 ML.

438 **5.1.11.2. Principales desviaciones**

439 • El proyecto queda como compromiso presupuestario del año 2018, no fue
440 posible ejecutarlo en el mismo año debido contraposiciones entre la planificación de los
441 proyectos y los desembolsos de los recursos.

442 **5.1.11.3. Acciones propuestas**

443 • Ajustar la planificación de los proyectos para los siguientes periodos según
444 el comportamiento de los desembolsos de los recursos de la Ley N°8114-9329, para que
445 mientras sea viable se puedan evitar los compromisos presupuestarios.

446

447 **5.1.12. Meta - proyecto: Asfaltado Camino La Esperanza**

448 **5.1.12.1. Principales logros**

449 • Este proyecto se ejecutó durante el segundo semestre, considerando el
450 asfaltado y mejoras de caminos transversales en ciudadela La Esperanza, por 125 ML.

451

452



453

454 **5.1.12.2. Principales desviaciones**

455 • Según asignación presupuestaria del plan operativo anual, la ejecución de
456 este proyecto correspondía al primer semestre 2018; sin embargo, se llevó a cabo hasta
457 en el segundo.

458 **5.1.12.3. Acciones propuestas**

- 459 • Dar seguimiento a la ejecución de proyectos conforme lo planteado en el
460 plan operativo anual.

461

462 **5.1.13. Meta - proyecto: Asfaltado Camino "Marcelino"**

463 **5.1.13.1. Principales logros**

- 464 • Según oficio CMDC-IGV-063-2018 al corte del segundo semestre 2018,
465 queda adjudicado el proyecto de suministro y colocación de mezcla asfáltica en 5 cm de
466 espesor y un ancho promedio 4 metros en camino "Marcelino" por 500 ML.

467 **5.1.13.2. Principales desviaciones**

- 468 • El proyecto queda como compromiso presupuestario del año 2018, no fue
469 posible ejecutarlo en el mismo año debido contraposiciones entre la planificación de los
470 proyectos y los desembolsos de los recursos.

471 **5.1.13.3. Acciones propuestas**

- 472 • Ajustar la planificación de los proyectos para los siguientes periodos según
473 el comportamiento de los desembolsos de los recursos de la Ley N°8114-9329, para que
474 mientras sea viable se puedan evitar los compromisos presupuestarios.

475 **5.1.14. Meta - proyecto: Mantenimiento y mejoras caminos varios**

476 **5.1.14.1. Principales logros**

- 477 • Destaca la compra de material de agregados (sub-base 3" triturado, base 1
478 ½" triturado y arena) para la intervención de tramos en caminos vecinales en estado
479 crítico por el deterioro a causa de las lluvias, y para realizar mejoras en caminos previo
480 a ser asfaltados; así como la compra de mezcla asfáltica y emulsión para contar con el
481 material requerido ante necesidades de atención de vías por imprevistos o
482 mantenimientos menores, y de tubería de concreto C-14 (alcantarilla) pluvial de 18" y
483 24". Además; se adquirió una mezcladora de concreto y una plancha vibratoria, con el
484 propósito de dotar a la Institución de equipo útil para llevar a cabo obras menores de

485 mantenimiento de las vías.



486

487

488 **5.1.14.2. Principales desviaciones**

- 489 • La mayor parte de la ejecución de los recursos se dio durante el segundo
- 490 semestre 2018; mientras que estaba programado para el primer semestre según plan
- 491 operativo anual.

492 **5.1.14.3. Acciones propuestas**

- 493 • Dar seguimiento a la ejecución de proyectos conforme lo planteado en el
- 494 plan operativo anual.

495

496 **5.1.15. Meta - proyecto: MOPT - BID II**

497 **5.1.15.1. Principales logros**

- 498 • Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta.

499 **5.1.15.2. Principales desviaciones**

- 500 • Este proyecto se trata de una contrapartida, por lo que su ejecución es
- 501 posterior a la intervención del MOPT, que por retrasos por parte del Gobierno Central
- 502 no se ha desarrollado el proyecto; por lo que el CMD Cervantes debe esperar el inicio
- 503 por parte del MOPT para luego llevar a cabo la partida.

504 **5.1.15.3. Acciones propuestas**

- 505 • Mantener pendiente la ejecución de esta partida, y incorporar estos recursos
- 506 en presupuesto extraordinario del periodo 2019.

507

508 **5.1.16. Meta - proyecto: Campaña Residuos Sólidos**509 **5.1.16.1. Principales logros**

- 510
- Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta.

511 **5.1.16.2. Principales desviaciones**

- 512
- Debido a que no se logró la recaudación total del ingreso por servicio de recolección de basura (recursos que dan origen a este proyecto) se dejó pendiente su ejecución.

515 **5.1.16.3. Acciones propuestas**

- 516
- Mejorar la gestión de cobro del servicio de recolección de basura con el fin de contar con recursos suficientes para el desarrollo de este tipo de proyectos que fomentan el adecuado manejo de los residuos sólidos en el distrito.

519 **5.1.17. Meta - proyecto: Limpieza y Mantenimiento Finca Centro Acopio**520 **5.1.17.1. Principales logros**

- 521
- Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta.

522 **5.1.17.2. Principales desviaciones**

- 523
- No se cuenta con el recurso humano suficiente que se dedique al desarrollo de este tipo de proyectos, debido al recargo de funciones del personal.

525 **5.1.17.3. Acciones propuestas**

- 526
- Dar seguimiento en los próximos periodos a la ejecución de la mayor cantidad de proyectos posibles.

528 **5.1.18. Meta - proyecto: Catastro**529 **5.1.18.1. Principales logros**

- 530
- Durante el periodo 2018 se inició el proceso de ordenamiento de la base de datos, depuración y recepción de declaraciones de bienes inmuebles del distrito de Cervantes, dicho procedimiento con la contratación de una persona bajo la modalidad

533 de servicios especiales que se encargó de llevar a cabo todas estas funciones, y con el
 534 apoyo de las capacitaciones y seguimiento recibido por parte de personal de la ONT;
 535 también, se realizaron adquisiciones referentes al equipamiento de oficina y cómputo
 536 para realizar estas funciones. A raíz de los esfuerzos realizados en esta primera etapa, se
 537 obtuvieron resultados satisfactorios; entre los cuales destacan:

538

- 539 ✓ La recaudación del impuesto de bienes inmuebles durante el año 2018 fue de un 200%
 540 en comparación con el monto que fue presupuestado.
- 541 ✓ Durante el periodo del 10 de setiembre del 2018 al 11 de diciembre del 2018 se
 542 recibieron 266 declaraciones de I.B.I., las cuales representan un incremento en la base
 543 imponible de aprox. ¢2,547,883,065.79 que entraba en vigencia a partir de enero 2019.
- 544 ✓ En el transcurso del periodo del 12 de setiembre del 2018 al 29 de noviembre del 2018
 545 se entregaron 104 notificaciones a contribuyentes, a los cuales ya se les ha vencido el
 546 plazo para presentar declaración de actualización de I.B.I.
- 547 ✓ A través del sistema SENDA del Registro Nacional se obtiene información trimestral
 548 sobre hipotecas; de las cuales en el segundo semestre del 2018 se revisaron 94 casos,
 549 resultando preciso aumentar el valor de la base imponible en 74 de estos según el monto
 550 de los gravámenes reportados.



551

552

553 **5.1.18.2. Principales desviaciones**

- 554 • Se ejecutaron las partidas presupuestarias del proyecto conforme a las
 555 necesidades; los saldos sobrantes fueron mínimos.

556 **5.1.18.3. Acciones propuestas**

557 • Continuar con el desarrollo del proyecto de actualización de valores y
558 ordenamiento, divulgar este proceso de forma tal que se acerquen más contribuyentes a
559 actualizar el valor de sus propiedades.

560 **5.1.19. Meta - proyecto: Parques Infantiles**

561 **5.1.19.1. Principales logros**

562 • Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta.

563 **5.1.19.2. Principales desviaciones**

564 • No se cuenta con el recurso humano suficiente que se dedique al desarrollo
565 de este tipo de proyectos, debido al recargo de funciones del personal.

566 **5.1.19.3. Acciones propuestas**

567 • Dar seguimiento en los próximos periodos a la ejecución de la mayor
568 cantidad de proyectos posibles en pro de la satisfacción de las necesidades del distrito.

569 **5.1.20. Meta - proyecto: Acceso Barrio El Descanso**

570 **5.1.20.1. Principales logros**

571 • Se llevó a cabo el proyecto durante el segundo semestre 2018, que consistió
572 en la construcción de acera, construcción de área de conexión en adoquín, construcción
573 de jardineras, construcción de drenaje, construcción caja pluvial TM-1 y muro en dos
574 hiladas de block, con el propósito de embellecer el área ubicada contiguo al parque en
575 el Bajo de Cervantes que se encuentra sin uso y a la vez peligroso ya que no existe obra
576 de infraestructura apta y segura para transitar.



577

578 **5.1.20.2. Principales desviaciones**

- 579 • El proyecto fue ejecutado conforme lo programado en el segundo semestre
580 2018.

581 **5.1.20.3. Acciones propuestas**

- 582 • Continuar en los siguientes periodos con el desarrollo de este tipo de
583 proyectos conforme las necesidades de la población.

584

585 **5.1.21. Meta - proyecto: Mejoras Acueducto**

586 **5.1.21.1. Principales logros**

- 587 • Dentro de los recursos ejecutados destacan; la contratación de personal bajo
588 la modalidad de jornales para trabajos de carácter manual, la compra de material de
589 agregados, tubería y accesorios de PVC; requeridos para efectuar mejoras en las redes
590 de distribución del acueducto municipal. Como parte de los sectores intervenidos se
591 pueden señalar: cambio de tubería en 2” en camino San Ignacio de Loyola, y red nueva
592 de acueducto en 2” en barrio San Pancracio, cambio de tubería en IMAS de abajo.



593



594

595

596 **5.1.21.2. Principales desviaciones**

- 597 • Al corte del segundo semestre del 2018; no se logró ejecutar el proyecto en
598 su totalidad.

599 **5.1.21.3. Acciones propuestas**

- 600 • Planificar la ejecución de los recursos para lograr el desarrollo del proyecto
601 en su totalidad, atendiendo las mejoras urgentes a realizarle a la red del acueducto
602 municipal.

603

604 **5.1.22. Meta - proyecto: Mantenimiento Caminos Vecinales**

605 **5.1.22.1. Principales logros**

- 606 • Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta.

607 **5.1.22.2. Principales desviaciones**

608 • Debido al recargo de funciones del personal, no se logró atender la totalidad
609 de los proyectos programados.

610 **5.1.22.3. Acciones propuestas**

611 • Dar seguimiento para la ejecución de esta partida el próximo periodo.

612 **5.1.23. Meta - proyecto: Mejoras Edificio Municipal**

613 **5.1.23.1. Principales logros**

614 • Durante el segundo semestre del año 2018 se ejecutan parte de los recursos
615 incorporados en este proyecto, mediante la realización de trabajos eléctricos requeridos
616 en el Edificio Municipal (colocación malla de tierras, Instalación de toma 240 voltios en
617 el cuarto de servidor, ordenar centro de carga, reubicación y colocación correcta de
618 breaker principal del edificio municipal, cambio de plafones esquineros exteriores,
619 identificar y etiquetar todas las placas de toma corrientes, apagadores, placas de voz y
620 datos, identificar correctamente todas las líneas de datos en el edificio y colocar marcas
621 nuevas).

622 **5.1.23.2. Principales desviaciones**

623 • Solamente se ejecutó una parte de los recursos presupuestados, y no la
624 totalidad de lo programado.

625 **5.1.23.3. Acciones propuestas**

626 • Evaluar las necesidades de la Institución para así presupuestar los recursos
627 requeridos para obras de mantenimiento del edificio municipal.

628 **5.1.24. Meta - proyecto: Campo Deportivo Colegio Cervantes**

629 **5.1.24.1. Principales logros**

630 • Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta.

631 **5.1.24.2. Principales desviaciones**

632 • No se cuenta con el recurso humano suficiente que se dedique al desarrollo
633 de este tipo de proyectos, debido al recargo de funciones del personal.

634 **5.1.24.3. Acciones propuestas**

- 635 • Dar seguimiento en los próximos periodos a la ejecución de la mayor
636 cantidad de proyectos posibles.

637 **5.1.25. Meta - proyecto: Banda Talento Musical**

638 **5.1.25.1. Principales logros**

- 639 • Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta.

640 **5.1.25.2. Principales desviaciones**

- 641 • No se cuenta con el recurso humano suficiente que se dedique al desarrollo
642 de este tipo de proyectos, debido al recargo de funciones del personal.

643 **5.1.25.3. Acciones propuestas**

- 644 • Dar seguimiento en los próximos periodos a la ejecución de la mayor
645 cantidad de proyectos posibles.

646

647 **5.1.26. Meta - proyecto: Centro Cultural**

648 **5.1.26.1. Principales logros**

- 649 • Según oficio CMDC-IGV-060-2018 al corte del segundo semestre 2018,
650 queda adjudicado el proyecto que incluye: estudios básicos, diseño y construcción de
651 edificio Centro Cultural; para dotar a la población de Cervantes de un espacio de
652 integración social, para la recreación de actividades culturales, artísticas, de
653 capacitación, entre otros.

654 **5.1.26.2. Principales desviaciones**

- 655 • No se cuenta con el recurso humano suficiente que se dedique al desarrollo
656 de este tipo de proyectos, debido al recargo de funciones del personal.

657 **5.1.26.3. Acciones propuestas**

- 658 • Dar seguimiento en los próximos periodos a la ejecución de la mayor
659 cantidad de proyectos posibles en pro de la satisfacción de las necesidades del distrito.

660 **5.1.27. Meta - proyecto: Centro Diurno Adulto Mayor**

661 **5.1.27.1. Principales logros**

662 • Al segundo semestre del 2018, no se ejecutaron recursos en esta meta.

663 **5.1.27.2. Principales desviaciones**

664 • Durante el periodo 2018, se encontraba pendiente la aprobación del decreto
665 legislativo de autorización al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes para que
666 segregue, desafecte del uso público y done un terreno de su propiedad a la Asociación
667 Pro-Adulto Mayor Nueva Esperanza de Cervantes; que constituía parte de la primera
668 etapa para este proyecto.

669 **5.1.27.3. Acciones propuestas**

670 • Dar seguimiento a los trámites pendientes y su finalización; para así iniciar
671 con los procedimientos de contratación requeridos para la construcción de este edificio.

672 **5.1.28. Meta - proyecto: Camino Toro Loco**

673 **5.1.28.1. Principales logros**

674 • Durante el segundo semestre del 2018 se efectuó la compra de tubería de
675 concreto C-14 (alcantarilla) pluvial de 24” y 30” para la intervención en dicho camino,
676 así como la contratación del servicio de rehabilitación y mejoramiento del camino;
677 considerando, las colocaciones de tubería, construcción de cabezales varios, limpieza,
678 lastreado y conformación del área; a fin de encauzar las aguas pluviales y así evitar
679 daños sobre el camino que en épocas de invierno se vuelve intransitable a falta de obras
680 adecuadas que ayuden a conducir las aguas hacia colectores naturales (al cierre del
681 periodo 2018; se logran girar 3 de 5 desembolsos en partes iguales por avance de obra)

682



683

684 **5.1.28.2. Principales desviaciones**

- 685 • Una parte del proyecto queda como compromiso presupuestario del año
- 686 2018, no fue posible ejecutarlo en su totalidad al corte del periodo, por factores de
- 687 plazos en el inicio del proceso de contratación.

688 **5.1.28.3. Acciones propuestas**

- 689 • Agilizar los procedimientos de contratación administrativa, para la ejecución
- 690 de los proyectos en los plazos establecidos.

691

692 **5.1.29. Meta - proyecto: Camino Las Trojas**

693 **5.1.29.1. Principales logros**

- 694 • Se logra la adquisición de 66 toneladas de mezcla asfáltica en caliente en
- 695 boca de planta; así como la contratación para su acarreo y colocación en camino Las
- 696 Trojas para el mejoramiento de tramos que se encuentran en pésimas condiciones.



697

698 **5.1.29.2. Principales desviaciones**

- 699 • El proyecto fue ejecutado conforme lo programado en el segundo semestre
700 2018.

701 **5.1.29.3. Acciones propuestas**

- 702 • Continuar en los siguientes periodos con el desarrollo de este tipo de
703 proyectos conforme las necesidades de la población.

704

705 **6. Resultados institucionales semestrales**706 **II semestre 2018**707 **Concejo Municipal Distrito de Cervantes**

708

709 El siguiente gráfico muestra en sumas totales la ejecución del presupuesto asignado para el
710 segundo semestre del año 2018, estos datos señalan en términos porcentuales una ejecución
711 de recursos del 67.15% durante dicho semestre;

712

713


714

715

716

717

718

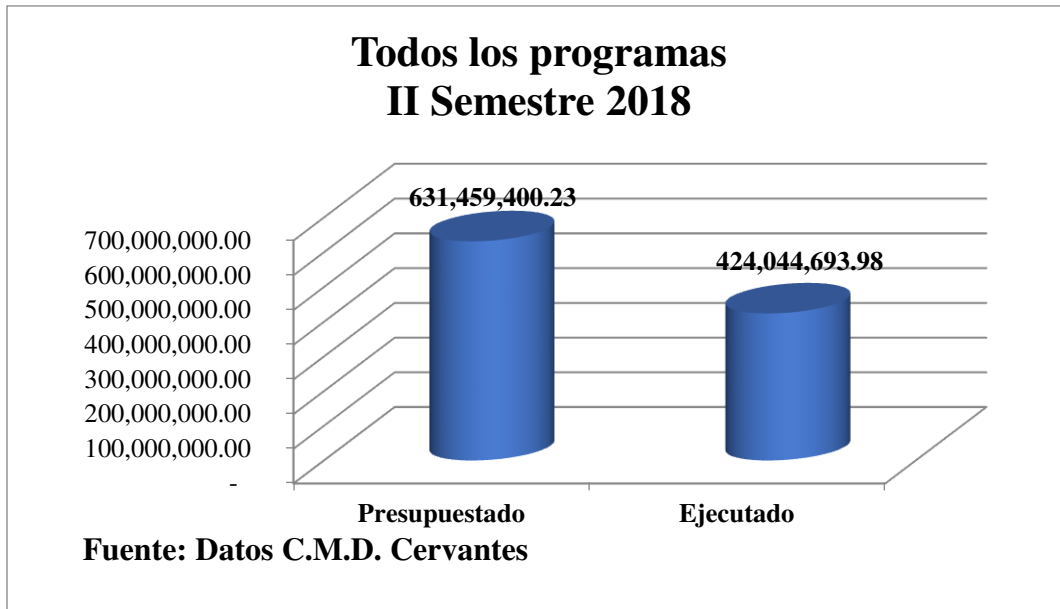

719

720


721 **7. Resultados institucionales anuales**
 722 **Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018**
 723 **Concejo Municipal Distrito de Cervantes**

724

725 Se presentan a continuación gráficos sobre la ejecución de recursos de forma anual
 726 por cada uno de los programas presupuestarios.


727 En cuanto al Programa I (Administración General) se muestra la suma de lo
 728 ejecutado durante el año 2018 en comparación con lo presupuestado, cuyos datos
 729 representan en términos porcentuales una ejecución anual de estos recursos de un 82.73%:

730

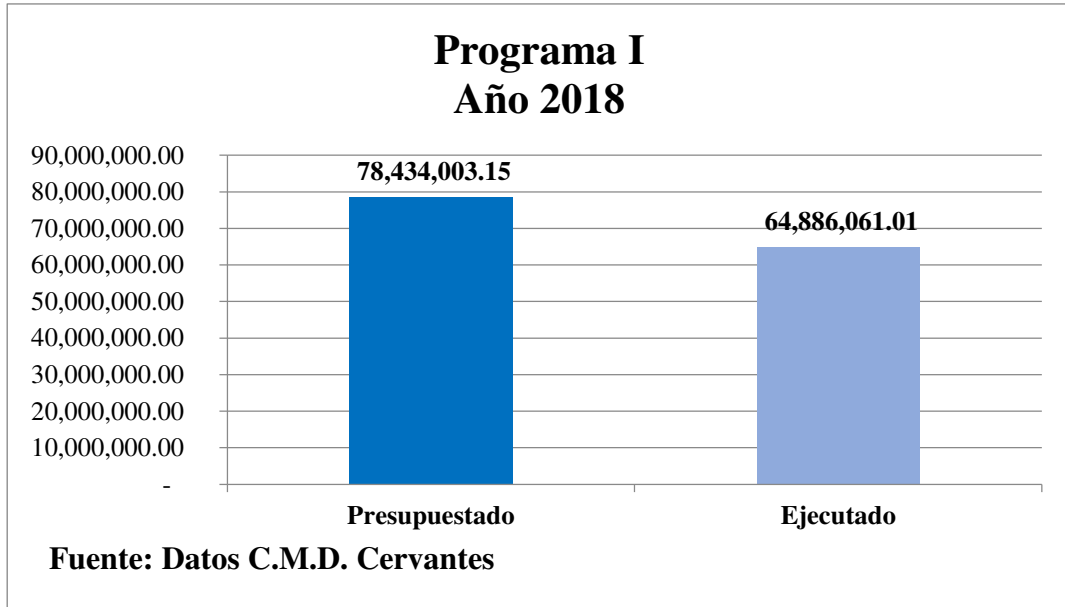

731

732 La siguiente información sobre el Programa II (Servicios Comunes) representa la
 733 ejecución de los recursos al corte del periodo 2018, y que en términos porcentuales fue de
 734 un 76.54% en relación al monto presupuestado para este programa:

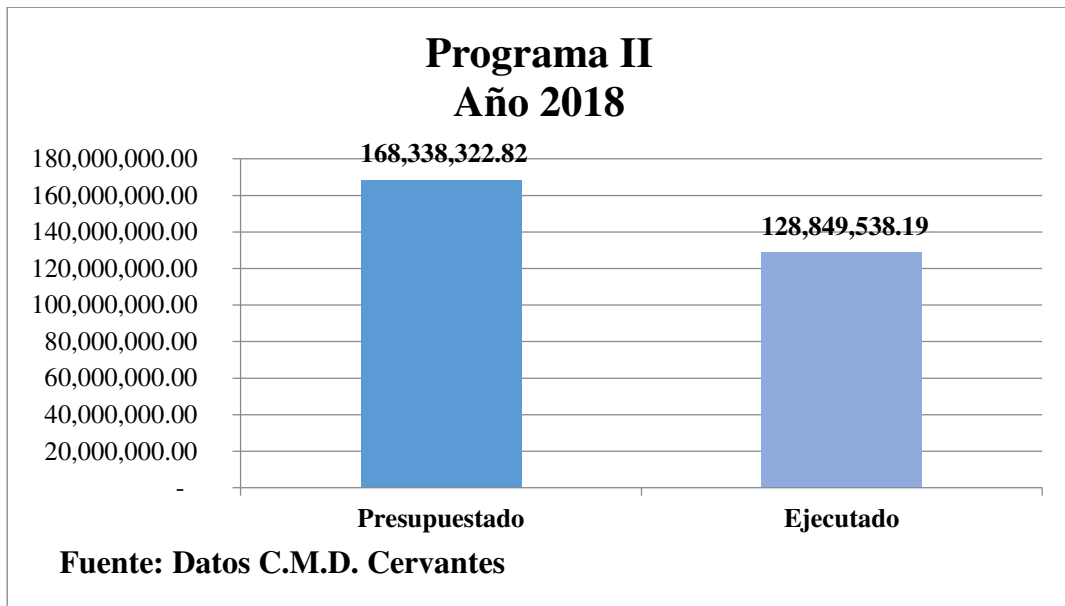


735

736

737

738 En lo referente al Programa III (Inversiones) la ejecución de los recursos de forma
 739 anual fue de un 53.92%, tal y como se presenta seguidamente:

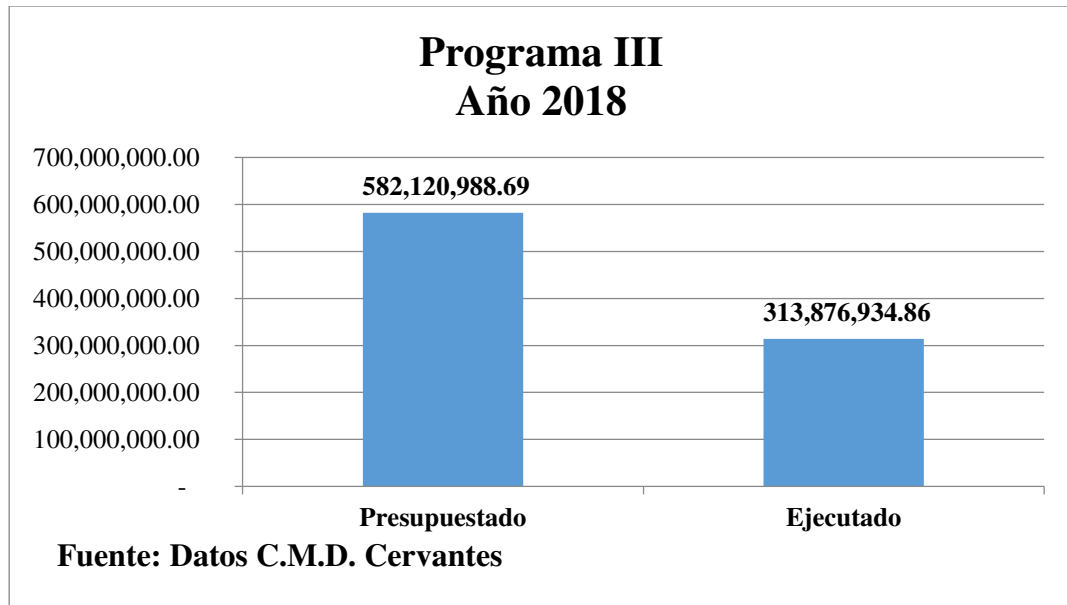

740

741 El siguiente gráfico muestra los montos de la ejecución de recursos total para el año
 742 2018, así como lo presupuesto; cuyos datos generan como resultado una ejecución total de
 743 un 61.24%:

744



745

746 **8. Resultados institucionales anuales**
 747 **Cumplimiento metas plan operativo**
 748 **Concejo Municipal Distrito de Cervantes**

749

750 El grado de cumplimiento al primer semestre de las metas planteadas en el plan
 751 operativo para el año en curso, se presenta a continuación:

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES						
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2018						
AL 30 DE JUNIO DE 2018						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	0%	0%	40%	39%	40%	39%
Programa II	0%	0%	22%	19%	22%	19%
Programa III	16%	0%	50%	33%	17%	1%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	5%	0%	37%	30%	20%	15%


752

753 Además, se presentan los datos correspondientes al corte del segundo semestre del
 754 periodo 2018 (al 31 de diciembre del 2018):

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES						
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2018						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	0%	0%	100%	85%	100%	85%
Programa II	0%	0%	100%	55%	100%	55%
Programa III	100%	28%	100%	83%	100%	30%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	25%	7%	75%	56%	75%	43%

755

756

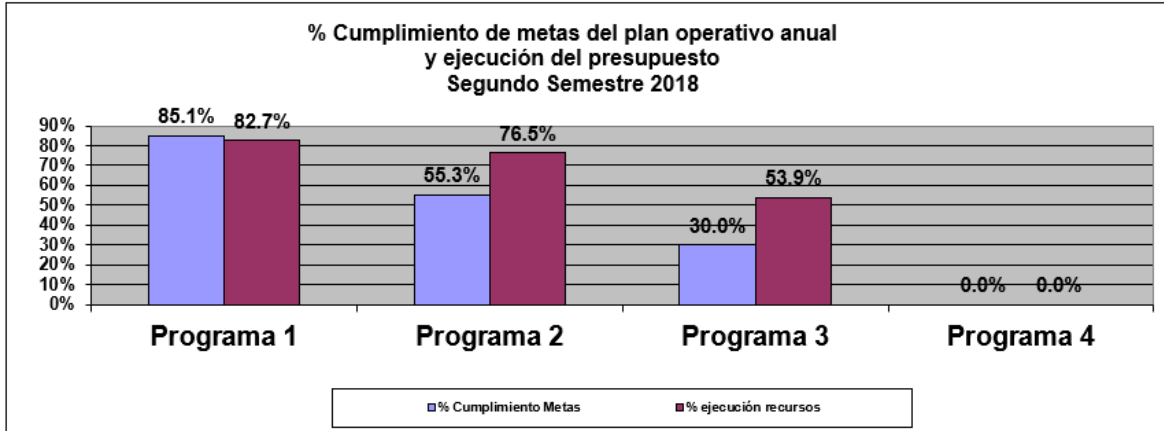

757

758

759 **9. Resultados institucionales anuales**760 **Comportamiento de los ingresos**761 **Concejo Municipal Distrito de Cervantes**

762

	Estructura de ingresos	Total Presupuesto	Total Ingresado	Pendiente a ingresar	% Recaudación al 31 de diciembre 2018
	Totales	828,893,314.66	801,158,193.54	27,735,121.12	
1	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729	13,500,000.00	27,009,244.60	- 13,509,244.60	200.07%
2	Impuesto sobre el cemento	48,000,000.00	48,094,110.58	- 94,110.58	100.20%
3	Impuestos específicos sobre la construcción	7,500,000.00	8,229,326.00	- 729,326.00	109.72%
4	Patentes Municipales	15,000,000.00	22,179,472.00	- 7,179,472.00	147.86%
5	Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos	4,000,000.00	4,794,525.00	- 794,525.00	119.86%
6	Timbre Pro-parques Nacionales	400,000.00	618,364.00	- 218,364.00	154.59%
7	Venta de agua	52,000,000.00	55,088,240.00	- 3,088,240.00	105.94%
8	Servicio de instalación y derivación de agua	2,000,000.00	2,309,781.00	- 309,781.00	115.49%
9	Servicio de recolección de basura	77,284,800.00	66,351,538.50	10,933,261.50	85.85%
10	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	8,000,000.00	6,331,083.33	1,668,916.67	79.14%
11	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	-	3,362,902.96	- 3,362,902.96	-
12	Multas varias (Infracción Ley de construcciones)	300,000.00	571,600.00	- 271,600.00	190.53%
13	Intereses moratorios	5,000,000.00	5,676,729.50	- 676,729.50	113.53%
14	Aporte IFAM Licores Nacionales	734,027.59	539,167.80	194,859.79	73.45%
15	Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal	271,034,271.00	225,861,892.20	45,172,378.80	83.33%
16	Superávit libre	8,583,725.28	8,583,725.28	-	100.00%
17	Superávit específico	315,556,490.79	315,556,490.79	-	100.00%

763

764

765 **Elaborado por:**

766 Lcda. Mery Araya Molina

767 Contadora Municipal

768 Concejo Municipal Distrito de Cervantes

769 Fecha: 29 de enero del 2019

770 cc. Archivo

771 ACUERDO FIRME.

772 Consulta el señor Presidente Jorge Adolfo Aguilar, a la Intendencia, que se hizo
773 la policía.

774 Informa Gustavo Castillo Morales, ayer yo les envíe un mensaje por si podían
775 venir a una reunión que había y que participaran de la misma; en esa reunión se
776 iban a tratar dos temas: El convenio que tiene la Asociación de Desarrollo con la
777 Fuerza Pública para el uso de las instalaciones del local de siempre y el tema de
778 la inseguridad que se está viviendo acá en Cervantes; en la reunión participamos
779 el teniente Alemán que es el Jefe Cantonal, Erick Calderón Jefe de la Policía del
780 Área de Cartago, estuvo otro oficial de apellido Monestel que es el Jefe del GAO
781 de la provincia de Cartago, Brayan Jiménez Administrador de la Fuerza Pública
782 de Cartago, la Asociación de Desarrollo la reunión fue promovida por ellos y yo
783 que me hice presente y otra representación de vecinos no sé cómo se habrá
784 manejado a convocatoria, en síntesis se expuso toda la problemática que se está
785 viviendo en la comunidad en esa parte no me voy a referir porque para que si
786 sabemos la situación que se está viviendo, la inseguridad todos la han vivido, en
787 síntesis este señor Erick Calderón como Jefe de la Policía se comprometió y le
788 dijo a Alemán Jefe Cantonal, de que la presencia de policías en Cervantes tiene
789 que ser prioritaria, ayer Oscar González les presentó unas estadísticas que
790 maneja el OIJ y se demuestra que Cervantes tiene tres veces más índice
791 delictivo que Pacayas y Capellades, Cervantes es una zona conflictiva por
792 muchas razones, estamos sobre una ruta primara, entonces esa fue la directriz
793 que se le giró a la Fuerza Pública de acá de Alvarado, de mantener presencia
794 acá y que la patrulla esté veinticuatro horas al día y también se presentaron dos
795 oficiales nuevos, recién graduados se graduaron ahora el miércoles y ya ayer
796 fueron asignados a Alvarado, van a estar exclusivamente para Cervantes eso se
797 acordó. Bueno este señor Monestel también se le solicitó y se le dio orden de que
798 el GAO este viniendo constantemente a Cervantes.

799 Comenta Jorge Adolfo Aguilar a mí me tiene muy preocupada la situación que se
800 da en la plaza del Bajo, yo no sé cómo hacemos o que hay que hacer porque la
801 verdad ya estamos casados esa gente están todos los días desde la mañana
802 hasta la noche están ahí. Manifiesta Gustavo yo lo viví con la instalación del play
803 estuve bajando a ver cómo iban los trabajos de la instalación y llegar a las
804 ocho de la mañana y que ya estén ahí como zopilotes, yo les digo así porque
805 están agachados, esperando que les pegue el sol, a cualquier hora que llegue

806 uno ahí están, inclusive la gente que instalaba el play le comentaron que a uno lo
807 agarraron y lo golpearon porque se robó una escalera de la fábrica de los
808 prefabricados, si es preocupante la situación ayer en esa reunión había solo
809 gente del Alto, a estaban Jacquelin y Luis Leiton pero no pidieron palabra yo al
810 final cuando terminó la reunión hable con Erick Calderón yo le dije supongo que
811 Alemán lo tiene informado y yo se lo hice ver al SR, de la GAO que el Bajo es
812 aún más conflictiva que aquí el Centro, ellos tienen identificados lo que es el
813 Kilómbo.

814 Manifiesta Jorge Adolfo Aguilar, nada hacemos ya estamos cansados ellos tienen
815 identificados, identificados, que ellos saben dónde vende la droga, pero seguimos
816 en lo mismo y no se hace nada, aquí la idea talves doña Cecilia nos acompaña
817 organizamos una reunión con todos los vecinos será para hacer lo que están
818 haciendo en San Carlos día sí porque día y noche están ahí, con uno no se van
819 a meter pero el barrio va perdiendo fama y ya se tiene muy mala fama la verdad
820 es esa ya estamos cansados. Ahí en el Bajo dónde está ese parquecito nuevo el
821 mismo problema.

822 Comenta la concejal doña Cecilia Valverde, que el otro día que conversaba con
823 Anderson del Parquecito del Bajo es igual ahí llegan también

824 Comenta Anderson Calderón que yo pensaba que talves se pudiera cerrar para
825 que en las noches no se puedan ingresar ese tipo de personas, porque mentira
826 que una familia va a ir en la noche.

827 Si dice Gustavo como yo les comentaba manejar los parquecitos infantiles que se
828 piensan colocar.

829 Comenta Adolfo que fue un problema abrir ese camino por donde Alberto
830 Obando, eso nunca se debió haber abierto cuando ellos compraron esa propiedad
831 , la entrada de ellos estaba por la terraza de donde Pelé, por ahí estaba a entrada
832 para esa casa, ellos permitieron que les construyeran eso ahí les cerraron la
833 entrada, pero eso por ahí nunca tuvo entrada , ni hay camino al otro lado, eso la
834 gente lo comenzó abrir ahí. Y nadie se metió en nada, eso no importa porque
835 se aprovecha para todos los que viven ahí.

836 Manifiesta Gustavo que esos vestidores son un problema ahí.

837 Yo pienso manifiesta Jorge Adolfo hacer una reunión con los vecinos y que
838 todos estemos al tanto que los corran en las noches y en el día también.

839 Gustavo Castillo Intendente si quieren ustedes convocan la reunión y yo hablé
840 con Alemán para que se haga presente.

841 Si en realidad debemos de hacer algo los domingos están jugando los chiquitos
842 y ese montón ahí fumando droga, se meten debajo de los árboles, pero también
843 es un pecado tener que cortar los árboles de la plaza pero ahí es donde se
844 meten.

845 Informa Gustavo que con el tema del convenio Oscar es muy insistente ; yo
846 tengo contacto con el Viceministro y me dice que se lo pase al Viceministro. Y en
847 realidad ese no era el orden como se debió haber manejado , las cosas llegan a
848 quien tiene que ser, el convenio tiene que llegar al administrador de Fuerza
849 Pública de Cartago y de ahí él lo envía a quien tenga que verlo, pero empezamos
850 de arriba para abajo entonces ni el ministro lo vio y no se hizo nada , ya se
851 aclaró el asunto y se va a ver de qué forma se logra eso por el lado del convenio
852 del uso de este local, también estamos de lleno con lo que es la donación de

853 este terreno, estoy detrás de la Junta de Educación, para que cedan parte de este
854 terreno de aquí atrás , que a mí me sirve por la seguridad del pueblo y ahora que
855 se va a tener el centro cultural y a municipalidad, eso yo lo estoy manejando con
856 la Junta de Educación si se dona el terreno ya la Asociación se comprometió a
857 pagar el plano y la escritura para donárselo al Ministerio y el ministerio está muy
858 interesado en la donación del terreno para solicitar la delegación para
859 Cervantes, claro que eso va a ser un proceso político, primero que todo y que
860 hay que traer una lista y queda a la espera de la disponibilidad de recursos del
861 Gobierno, pero es un proyecto a largo plazo pero que en algún momento se llega
862 a dar.

863 ARTÍCULO V

864 Cierre de Sesión.

865

866 Al ser las 6:30p.m. se concluye la sesión.

867

868

869

870

871

872

873 Jorge Adolfo Aguilar Mora

874 Presidente Municipal.

875

Thais Araya Aguilar

Secretaria Municipal.0
